

COMUNE DI SAN POLO D'ENZA



SCALA 1:200

SIC.02

RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE DI  
PIAZZA SARTORI ED EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO DELLE AREE LIMITROFE ALLA  
ROCCA

CIG B62FBEA3E CUP G45C24000020006

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO  
Ing. Severo Paggi

PROGETTISTA  
Arch. Giulia Dall'oglio  
Via Tevere 14  
41013 REGGIO EMILIA  
email: giuliodalloglio@protonmail.it

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI  
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE  
Ing. Alex Janni  
Via Tevere 14  
41013 REGGIO EMILIA  
E-MAIL: alexjanni@protonmail.it

STATO DI PROGETTO - DEFINIZIONE DEI MACRO INTERVENTI

EMISIONE  
Progetto esecutivo      aprile 2025


PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
CANTIERE  
SANTO SPIRITO  
S. LUCIANO  
S. PIETRO  
S. VINCENZO  
S. GIUSEPPE  
S. GIULIO  
S. MARCO  
S. MARTINO  
S. PIERPAOLO  
S. ROSTIFOLLO  
S. VITO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
CANTIERE  
SANTO SPIRITO  
S. LUCIANO  
S. PIETRO  
S. VINCENZO  
S. GIUSEPPE  
S. GIULIO  
S. MARCO  
S. MARTINO  
S. PIERPAOLO  
S. ROSTIFOLLO  
S. VITO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
CANTIERE  
SANTO SPIRITO  
S. LUCIANO  
S. PIETRO  
S. VINCENZO  
S. GIUSEPPE  
S. GIULIO  
S. MARCO  
S. MARTINO  
S. PIERPAOLO  
S. ROSTIFOLLO  
S. VITO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA  
CANTIERE  
SANTO SPIRITO  
S. LUCIANO  
S. PIETRO  
S. VINCENZO  
S. GIUSEPPE  
S. GIULIO  
S. MARCO  
S. MARTINO  
S. PIERPAOLO  
S. ROSTIFOLLO  
S. VITO

FASE 2

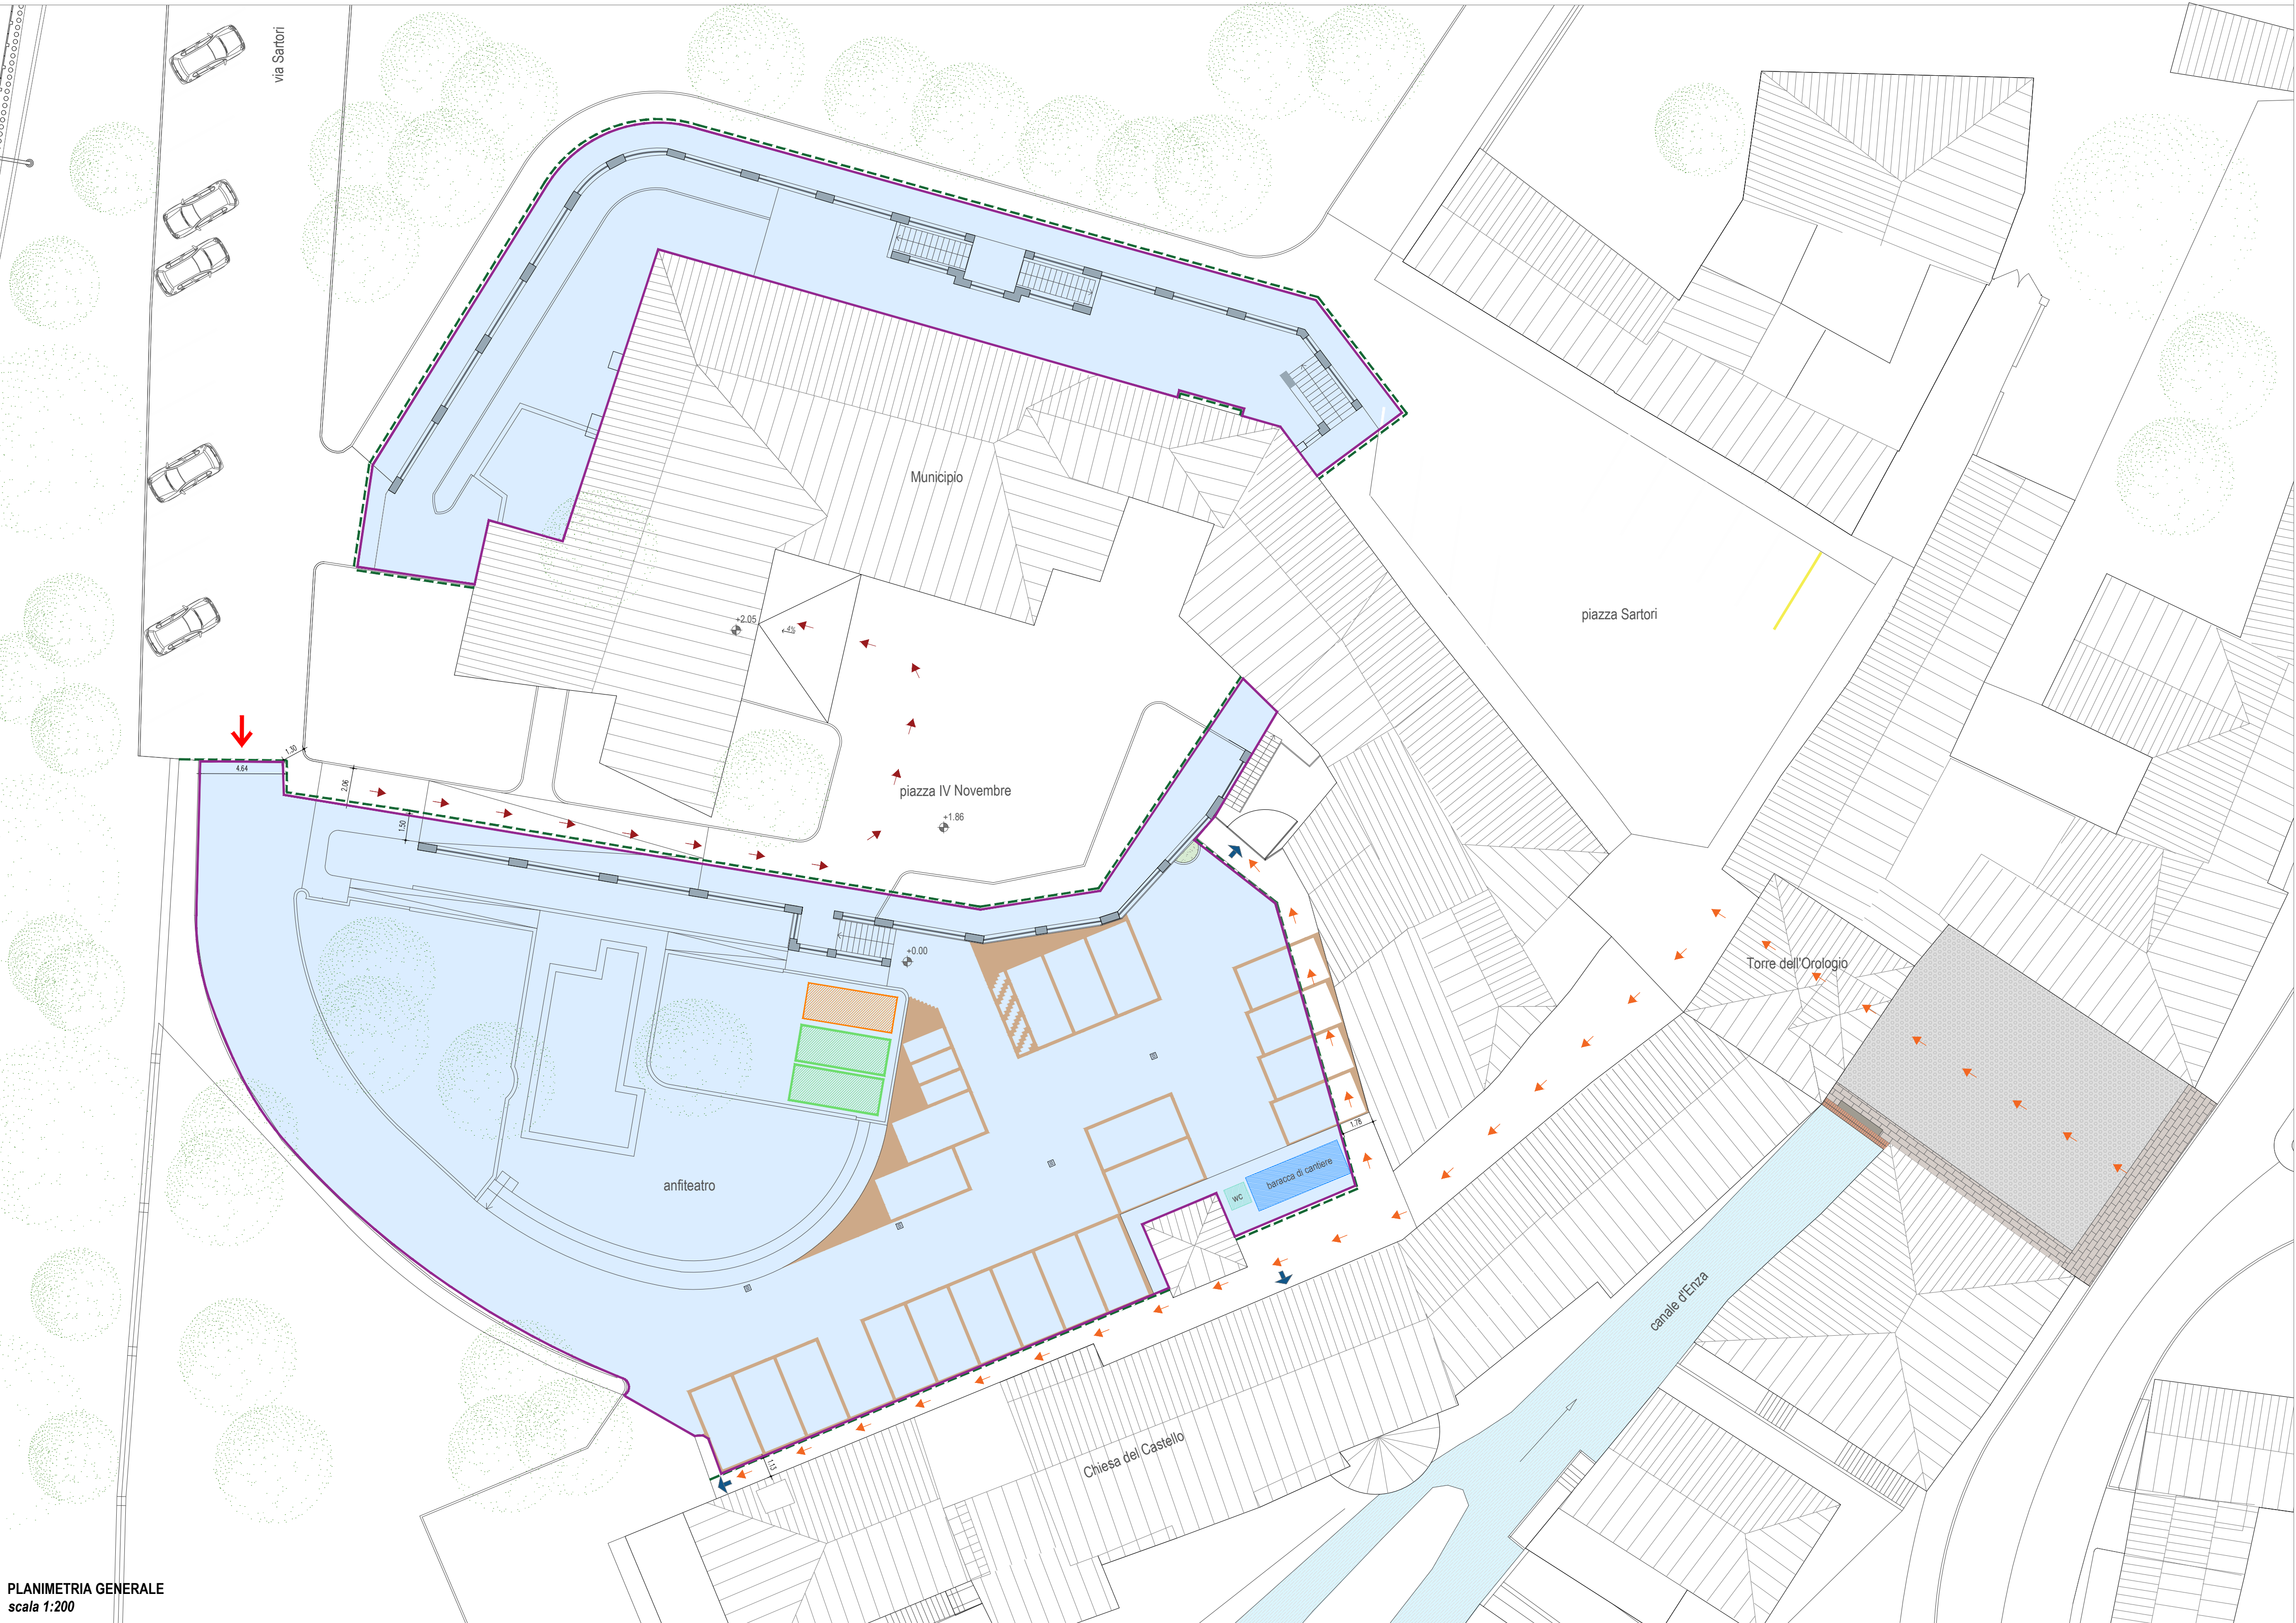

PLANIMETRIA GENERALE  
scala 1:200

**FASE 1**

La prima fase prevede la demolizione della superficie in asfalto in tutte le aree, compresa la superficie prossima all'ingresso pedonale privato, prevedendo pertanto la chiusura del passaggio per mezza giornata


**FASE 2**

La seconda fase prevede di delimitare il passaggio pedonale di accesso alla abitazione privata con installazione di recinzione metallica e realizzazione di passerella pedonale in tavole di legno come si evince dalla planimetria allegata. Questa fase prevede, oltre alla realizzazione delle opere sulla pavimentazione, anche la realizzazione di tutte le opere previste sulle torrette e sulle balaustre. Durante la seconda fase viene consentito l'accesso pedonale agli uffici municipali.

**FASE 3**

La terza fase prevede di effettuare le lavorazioni mancanti sulla pavimentazione in corrispondenza del corridoio per l'accesso pedonale ed in corrispondenza della piccola porzione a fianco dell'ingresso di cantiere. In questa fase sarà inoltre interdetto l'utilizzo dell'ingresso principale al Municipio per effettuare le lavorazioni sulla pavimentazione prospiciente tale ingresso. L'accesso agli uffici municipali avverrà tramite ingresso sul retro che dovrà essere fornito di passerelle temporanee per l'accesso da parte di persone con disabilità.

FASE 3

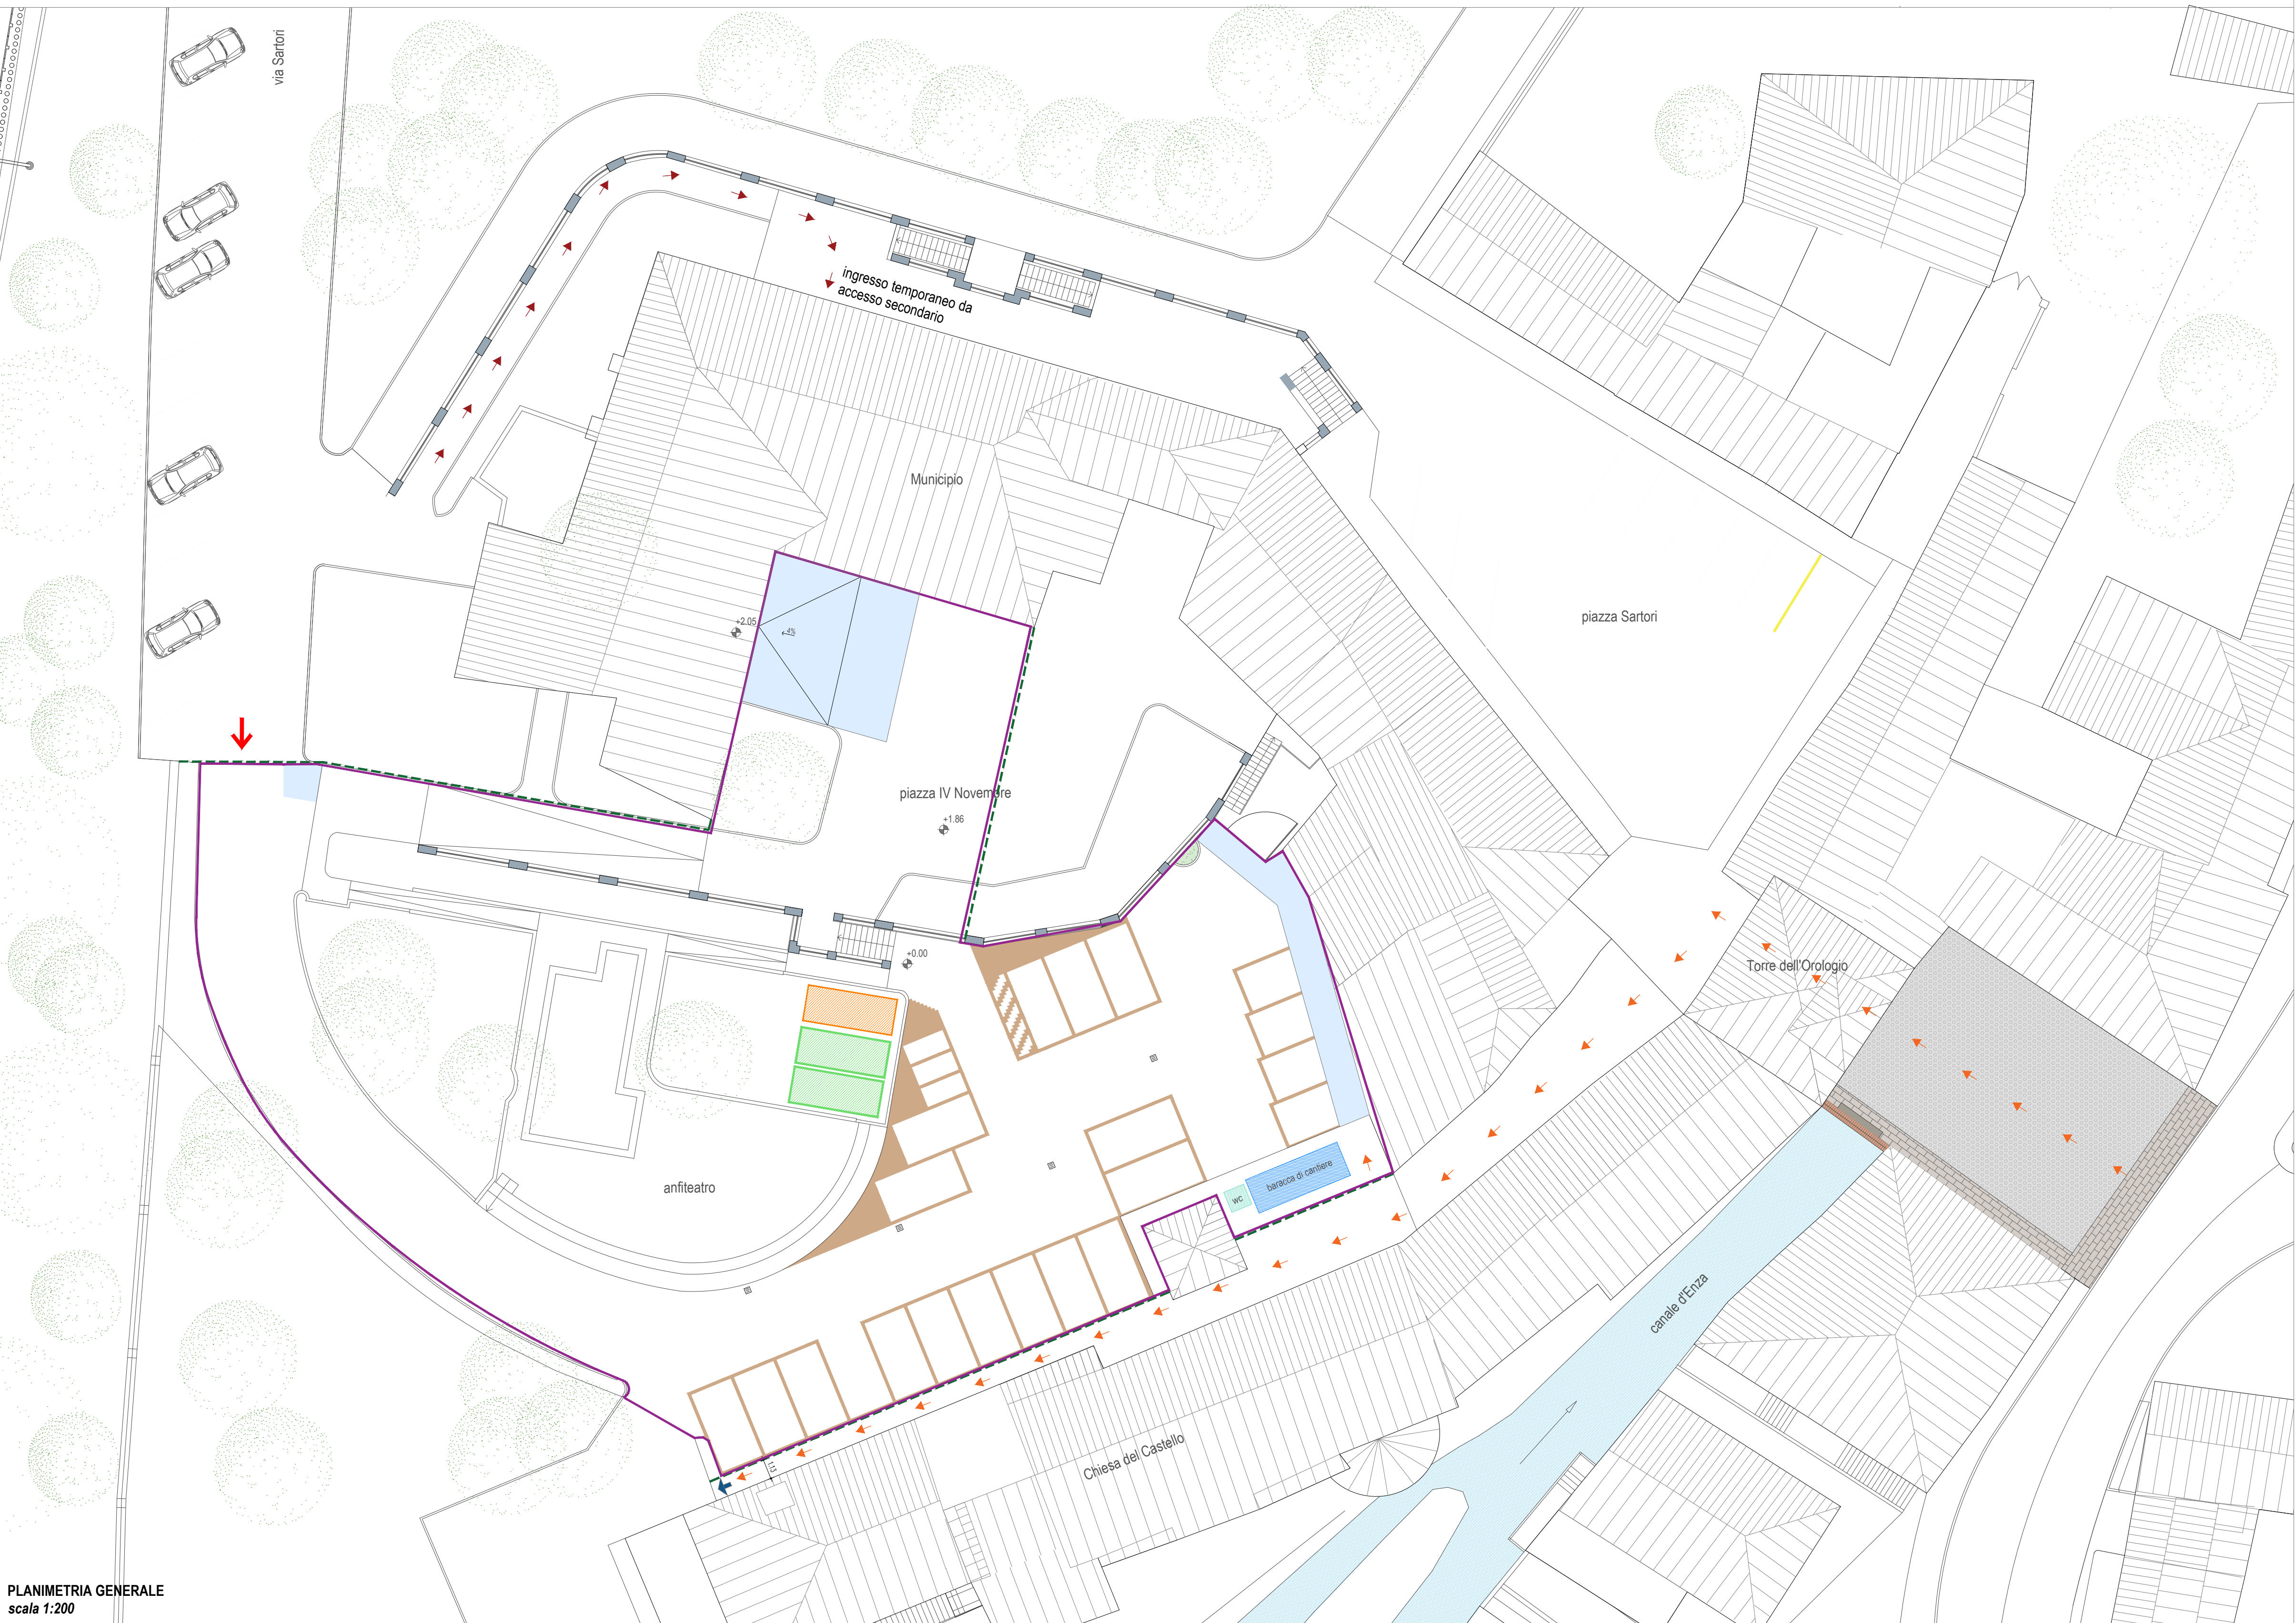

PLANIMETRIA GENERALE  
scala 1:200
